
Lindenfeld Lunch: Gateplan

Ein Gate ist ein Umsteigebahnhof: Hier wird entschieden, ob das Projekt weiterfährt. Die sechs Linien zeigen, was dabei zusammenkommt.

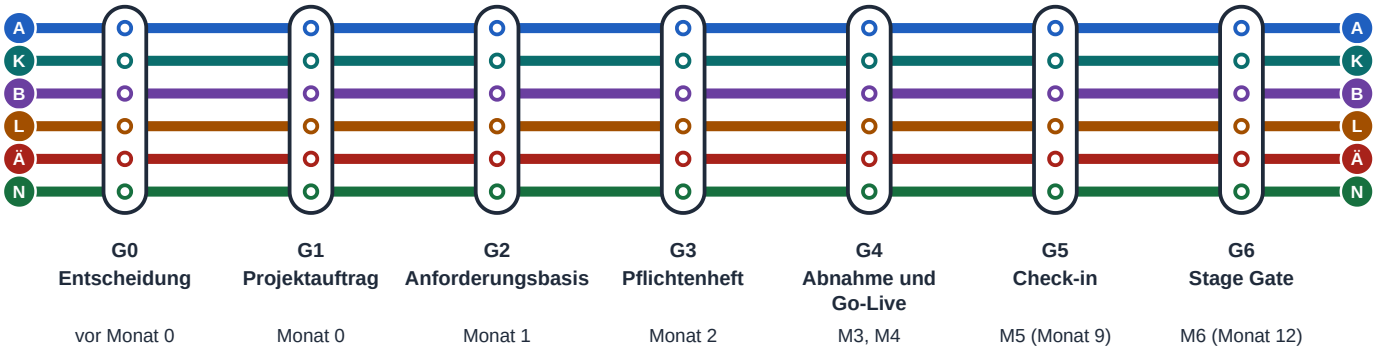

A Artefakte

Welche Dokumente und Backlogs entstehen, klassisch und agil.

K Kommunikation

Wie wird abgestimmt: Meilensteinplan und Berichte oder agile Events.

B Blickwinkel

Welche Fragen BA und PM am selben Gate stellen.

L Leitplanken

Recht, Regeln, Vereinbarungen und Normen, die einzuhalten sind.

Ä Änderung

Wie Änderungen kontrolliert durch die Artefakte laufen.

N Nutzen

Woran wir messen, dass es sich gelohnt hat.

So liest du dieses Blatt

1. Jedes Gate hat eine eigene Seite. Oben steht, **worum es geht**, dann die Entscheidung in Kürze.
2. Darunter siehst du vier Linien: wie das Gate aussieht, klassisch und agil, und wie die Business Analyse (BA) und das Projektmanagement (PM) darauf schauen.
3. Notiere unten, **was dich betrifft**. Die Kürzel, die auf der Seite vorkommen, stehen ganz unten.

Beispiel: Zeile „Entscheidung“ bei G0 heißt: An diesem Gate wird entschieden, ob Option A gestartet wird. Der Buchstabe daneben zeigt die Herkunft: F steht so im Fall · R abgeleitet (Rechnung oder Regel) · A Annahme, noch zu prüfen.

Fiktiver Trainingsfall. Alle Zahlen sind Planungsannahmen. Keine Rechtsberatung. Die vollständige Tabelle mit allen neun Linien steht im Anhang.

G0 Entscheidung

vor Monat 0

Lohnt sich das?

> **Worum geht es?** Bevor Geld ausgegeben wird, entscheiden die Verantwortlichen: Lohnt sich die Cafeteria-App überhaupt? Dafür werden Optionen miteinander und mit dem Nichtstun verglichen.

Das Gate in Kürze

Frage	Antwort im Fall	Herkunft
Entscheidung	Option A (nur Release 1) starten, mit Stage Gate nach 6 Monaten	F
Wer entscheidet	Lenkungskreis; Sponsorin Heike Brandl	F
Go-Kriterien	Alle fünf Fälle bedacht, Nichtstun verglichen, Break-even von 0,3 % Zeitverwertung (bei erreichtem GZ-4) bekannt	F
Warnsignal	Zeitverwertung nicht glaubhaft: bei 0 % ist jeder Kapitalwert negativ	F

So sieht das Gate in vier Linien aus

Linie	Was am Gate passiert	Herkunft
A Artefakte klassisch	Business Case nach Five Case Model mit Optionen A, B, C und Nichtstun	F
A Artefakte agil	Produktvision und erste Idee eines Product Goal	A
B Blickwinkel BA	Welches Ziel stützt das, und was kostet Nichtstun?	F
B Blickwinkel PM	Was kostet es (380.000 EUR plus 60.000 EUR Betrieb pro Jahr), und welches Risiko gibt es?	F

Denkfrage: Option B wirkt attraktiver, weil sie mehr Funktionen bringt. Warum startet der Fall trotzdem mit Option A?
Eine Frage, die du stellen könntest: Welche Zeitverwertung halten Sie für realistisch, und wer misst sie?

Meine Notizen: Was betrifft mich an diesem Gate?

Kürzel auf dieser Seite: GZ = Geschäftsziel · **Release** = Ausbaustufe des Produkts · **Lenkungskreis** = Entscheidungsgremium des Projekts · **Stage Gate** = Gate, an dem über die nächste Stufe entschieden wird

G1 Projektauftrag

Monat 0 (M0)

Dürfen wir starten, und mit welchem Rahmen?

> **Worum geht es?** Das Projekt bekommt sein Mandat: Ziele, Umfang, Budget und Termine stehen schwarz auf weiß, und eine Projektleitung wird benannt.

Das Gate in Kürze

Frage	Antwort im Fall	Herkunft
Entscheidung	Projekt mit 380.000 EUR Investition für Release 1 starten	F
Wer entscheidet	Heike Brandl unterschreibt; die Projektleitung wird noch benannt (OP-05)	A
Go-Kriterien	Ziele messbar, Umfang mit Ausschlüssen, Zielkonflikt GZ-2 offen ausgewiesen (37.800 EUR)	R
Warnsignal	Projektleitung, GZ-1-Zwischenwert und Reserve noch offen (OP-04, OP-05, OP-11)	A

So sieht das Gate in vier Linien aus

Linie	Was am Gate passiert	Herkunft
A Artefakte klassisch	Projektauftrag mit Zielen, Umfang, Meilensteinen, Budget und Risiken	R
A Artefakte agil	Product Goal und Story Map als Umriss des Product Backlog	R
B Blickwinkel BA	Stützt jede Funktion im Umfang ein Ziel, und was ist ausgeschlossen?	R
B Blickwinkel PM	Wer leitet das Projekt, und welche Budgets und Termine gelten?	A

Denkfrage: Warum steht der Zielkonflikt bei GZ-2 im Projektauftrag und nicht in einer Fußnote?
Eine Frage, die du stellen könntest: Welche Maßnahme außerhalb der Software soll die übrigen 7 Prozentpunkte bringen, und wer verantwortet sie?

Meine Notizen: Was betrifft mich an diesem Gate?

Kürzel auf dieser Seite: GZ = Geschäftsziel · **OP** = offener Punkt (noch nicht entschiedene Frage) · **Release** = Ausbaustufe des Produkts

G2 Anforderungsbasis

Monat 1 (M1)

Wissen wir, was gebraucht wird?

Worum geht es? Das Team legt fest, was gebraucht wird, so eindeutig und prüfbar, dass spätere Änderungen daran gemessen werden können.

Das Gate in Kürze

Frage	Antwort im Fall	Herkunft
Entscheidung	Anforderungsbasis v1.0 ist Grundlage für Pflichtenheft und Test	A
Wer entscheidet	Murat Kaplan (Fachseite) mit dem BA; Review mit Test und Datenschutz	A
Go-Kriterien	Anforderungen eindeutig, prüfbar, vollständig; Release 1: 14 von 15 mit Story und Testfall	F
Warnsignal	FR-14 ohne Story und Test; stille Gruppen nicht vergessen (Betriebsrat, Datenschutz, Entgeltabrechnung, Cafeteria-Personal, Betreiber des Firmen-Logins)	F

So sieht das Gate in vier Linien aus

Linie	Was am Gate passiert	Herkunft
A Artefakte klassisch	Lastenheft als Anforderungsbasis: FR, BR, NFR und Rückverfolgungsmatrix	F
A Artefakte agil	Product Backlog mit Epics und Stories, Akzeptanzkriterien nach INVEST	F
B Blickwinkel BA	Sind Anforderungen eindeutig, prüfbar und bis zum Ziel rückverfolgbar?	F
B Blickwinkel PM	Ist der Termin M1 realistisch, und wer schätzt?	A

Denkfrage: FR-14 (Gruppenbestellung) hat weder Story noch Testfall. Darf das Gate trotzdem passiert werden?
Eine Frage, die du stellen könntest: Wer braucht die Gruppenbestellung zuerst, und welches Ziel stützt sie?

Meine Notizen: Was betrifft mich an diesem Gate?

Kürzel auf dieser Seite: **FR** = funktionale Anforderung (was das System tun soll) · **BA** = Business Analyse · **INVEST** = Merkmale guter User Stories · **M0 bis M6** = Meilensteine (Monat 0 bis Monat 6 und später) · **Release** = Ausbaustufe des Produkts

G3 Pflichtenheft

Monat 2 (M2)

Wissen wir, wie wir es zusichern und prüfen?

> **Worum geht es?** Jetzt steht fest, wie die Anforderungen umgesetzt und geprüft werden. Offene Entscheidungen bekommen eine verantwortliche Person und eine Frist.

Das Gate in Kürze

Frage	Antwort im Fall	Herkunft
Entscheidung	Pflichtenheft für Release 1 freigeben; Kaufen oder Bauen entscheiden (ADR-01)	A
Wer entscheidet	Heike Brandl, technisch Tim Falkner	A
Go-Kriterien	Jede Anforderung mit Realisierungsvorgabe und Prüfweg; Regeln als Parameter; offene Punkte mit Eigentümer	R
Warnsignal	ADR-01, ADR-03 und ADR-04 offen; Zeitfenster-Frage OP-01 ungeklärt	A

So sieht das Gate in vier Linien aus

Linie	Was am Gate passiert	Herkunft
A Artefakte klassisch	Pflichtenheft mit Realisierungsvorgaben, Parametern und Abnahmekriterien	R
A Artefakte agil	Backlog mit Definition of Done, Architekturentscheidungen und Schnittstellen	R
B Blickwinkel BA	Hat jede Anforderung eine Realisierungsvorgabe und einen Prüfweg?	R
B Blickwinkel PM	Passt der Plan zum Budget, und wer trägt die offenen Risiken?	R

Denkfrage: Tim Falkner sagt: „Das Pflichtenheft schreibe ich nach dem Bau." Was entgegnest du am Gate G3?
Eine Frage, die du stellen könntest: Woran erkennt Lena Ostermann, dass FR-06 erfüllt ist, wenn es nur den Code gibt?

Meine Notizen: Was betrifft mich an diesem Gate?

Kürzel auf dieser Seite: OP = offener Punkt (noch nicht entschiedene Frage) · **ADR** = Architekturentscheidung · **FR** = funktionale Anforderung (was das System tun soll) · **Release** = Ausbaustufe des Produkts

G4 Abnahme und Go-Live

Ist es fertig, und darf es live gehen?

M3 und M4 (Monat 5 bis 6)

Worum geht es? Ist die App fertig, und darf sie live gehen? Die Abnahme prüft gegen Kriterien, die vorher festgelegt wurden.

Das Gate in Kürze

Frage	Antwort im Fall	Herkunft
Entscheidung	Release 1 abnehmen und live schalten	A
Wer entscheidet	Abnahme durch Heike Brandl, Murat Kaplan, Tim Falkner und Lena Ostermann	A
Go-Kriterien	Testfälle ausgeführt, kein blockierender Fehler offen, Betriebsvereinbarung und Datenschutz-Dokumentation liegen vor	R
Warnsignal	Betriebsvereinbarung fehlt, obwohl die Einführung der Mitbestimmung unterliegt (so im Fall)	F

So sieht das Gate in vier Linien aus

Linie	Was am Gate passiert	Herkunft
A Artefakte klassisch	Testprotokoll und Abnahmeprotokoll	R
A Artefakte agil	Increment, das die Definition of Done erfüllt	A
B Blickwinkel BA	Erfüllt das Ergebnis den Bedarf, und welche Lücke bleibt (etwa FR-14)?	F
B Blickwinkel PM	Sind Termin, Budget, Abnahme und Betriebsvereinbarung erreicht?	R

Denkfrage: Kurz vor dem Go-Live liegt die Betriebsvereinbarung nicht vor. Was tust du?
Eine Frage, die du stellen könntest: Was braucht der Betriebsrat, um der Vereinbarung zustimmen zu können?

Meine Notizen: Was betrifft mich an diesem Gate?

Kürzel auf dieser Seite: FR = funktionale Anforderung (was das System tun soll) · **Release** = Ausbaustufe des Produkts

G5 Check-in

M5 (Monat 9)

Wirkt es, und steuern wir nach?

Worum geht es? Nach einigen Monaten im Betrieb zeigt der Check-in, ob die Ziele auf Kurs liegen. Es wird nachgesteuert, über Release 2 wird noch nicht entschieden.

Das Gate in Kürze

Frage	Antwort im Fall	Herkunft
Entscheidung	Kurs halten oder nachsteuern; keine Freigabe	F
Wer entscheidet	Projektleitung und Cafeteria-Leitung steuern nach; die Sponsorin wird informiert	A
Go-Kriterien	Zwischenwerte der Key Results KR1.1 bis KR3.2 liegen im erwarteten Korridor	F
Warnsignal	KR1.2 verfehlt: Hürden im Anmeldeweg suchen, Ömer Yıldız interviewen; KR1.3 verfehlt: zweiten Change Request erwägen	F

So sieht das Gate in vier Linien aus

Linie	Was am Gate passiert	Herkunft
A Artefakte klassisch	Statusbericht mit den Zwischenwerten der Ziele	A
A Artefakte agil	Backlog neu geordnet nach Hebel auf die Key Results	F
B Blickwinkel BA	Welche Wirkung zeigen die Key Results, und was erklärt Abweichungen?	F
B Blickwinkel PM	Wo steht der Plan, und welche Risiken sind neu?	A

Denkfrage: Beim Check-in liegt die Nutzungsquote erst bei 30 % statt bei 50 %. Was ist der erste Schritt?
Eine Frage, die du stellen könntest: Beschreiben Sie Ihre letzte Bestellung vom Anfang bis zum Essen. Wo haben Sie gezögert?

Meine Notizen: Was betrifft mich an diesem Gate?

Kürzel auf dieser Seite: KR = Key Result (messbares Ergebnis)

G6 Stage Gate

M6 (Monat 12)

Release 2: ja, später oder nein?

Worum geht es? Die Sponsorin entscheidet mit Zahlen: Wird Release 2 gebaut, später oder gar nicht?

Das Gate in Kürze

Frage	Antwort im Fall	Herkunft
Entscheidung	Release 2 freigeben, um ein Quartal vertagen oder nicht starten	F
Wer entscheidet	Heike Brandl, auf Basis gemessener Werte	F
Go-Kriterien	EM-1 und GZ-1-Zwischenwert erreicht. Ampel-Vorschlag: Grün bei KR1.2 mindestens 0,70 und KR2.1 mindestens 0,50	F
Warnsignal	Gelb oder Rot bei einem der beiden Key Results; die Ampel allein entscheidet nicht, Abweichungen begründet die Sponsorin schriftlich	F

So sieht das Gate in vier Linien aus

Linie	Was am Gate passiert	Herkunft
A Artefakte klassisch	Entscheidungsvorlage zum Stage Gate mit gemessenen Werten	R
A Artefakte agil	Product Backlog für Release 2, geordnet nach dem Ergebnis des Gates	A
B Blickwinkel BA	Stimmt der gemessene Nutzen mit dem Business Case überein?	F
B Blickwinkel PM	Wie lautet die Entscheidungsvorlage, und wer entscheidet bis wann?	R

Denkfrage: EM-1 ist erreicht, der GZ-1-Zwischenwert nicht. Wird Release 2 freigegeben?
Eine Frage, die du stellen könntest: Welche Ursache sehen Sie für die Abfallquote, und was haben wir noch nicht probiert?

Meine Notizen: Was betrifft mich an diesem Gate?

Kürzel auf dieser Seite: GZ = Geschäftsziel · **KR** = Key Result (messbares Ergebnis) · **EM** = Erfolgsmetrik · **Release** = Ausbaustufe des Produkts · **Stage Gate** = Gate, an dem über die nächste Stufe entschieden wird

Glossar

Abnahme
Förmliche Prüfung gegen vorher festgelegte Kriterien, mit Entscheidung.

Akzeptanzkriterien
Bedingungen, unter denen eine Story als erfüllt gilt (Gegeben, Wenn, Dann).

Annahme
Aussage, die nicht belegt ist und validiert werden muss.

Basislinie
Abgestimmter Stand, gegen den Änderungen gemessen werden.

Business Case
Begründung einer Investition mit Optionen, Nutzen und Kosten.

Check-in
Zwischenprüfung der Key Results; steuert nach, gibt aber nichts frei.

Definition of Done
Gemeinsame Qualitätsvereinbarung für ein Increment (Scrum Guide 2020).

Epic
Große Anforderung, die in Stories zerlegt wird.

Gate
Entscheidungspunkt mit festen Kriterien: weiter, anpassen oder stoppen.

Increment
Nutzbares Ergebnis eines Sprints, das die Definition of Done erfüllt.

Key Result
Messbares Ergebnis, das zeigt, ob ein Objective erreicht wird.

Lastenheft
Beschreibt, was der Auftraggeber braucht (Anforderungsbasis).

Leitplanke
Rechtliche oder vereinbarte Grenze, die einzuhalten ist, etwa Datenschutz oder Mitbestimmung.

Meilenstein
Wichtiger Punkt im Plan, etwa M0 bis M6.

OKR
Objectives and Key Results: Ziele mit messbaren Ergebnissen.

Pflichtenheft
Beschreibt, wie der Auftragnehmer die Anforderungen umsetzt und prüft.

Product Backlog
Geordnete Liste dessen, was für das Produkt gebraucht wird (Scrum Guide 2020).

Product Goal
Langfristiges Ziel des Produkts; Verpflichtung des Product Backlog.

Projektauftrag
Autorisiert das Projekt und legt Ziele, Umfang, Rahmen und Befugnisse fest.

Rückverfolgbarkeit
Verknüpfung von Ziel, Anforderung, Story und Testfall.

Sprint Goal
Ziel des Sprints; Verpflichtung des Sprint Backlog.

Stage Gate
Gate, an dem über die nächste Stufe entschieden wird, hier Release 2.

Quellen

- Scrum Guide 2020
  Events, Artefakte und Verpflichtungen im Scrum.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Requirements engineering
  Eigenschaften guter Anforderungen. Veröffentlicht, Überarbeitung angekündigt; geprüft am 21.10.2026.
- ISO/IEC 25010:2023, Product quality model
  Qualitätsmerkmale für nicht-funktionale Anforderungen; geprüft am 21.10.2026.
- Lexware: Pflichtenheft (Sekundärquelle zu DIN 69901-5 und VDI 2519)
  Abgrenzung Lastenheft und Pflichtenheft; Sekundärquelle, Norm im Original prüfen.
- Wikipedia: Project charter (Sekundärquelle zum PMBOK)
  Zweck eines Projektauftrags; Sekundärquelle.
- BABOK Guide v3 und IREB
  Grundlage der Facetten und Techniken; Abschnitt je nach Thema im Original prüfen.

Normen am 21.10.2026 geprüft; vor dem Einsatz erneut prüfen.

Anhang: Netzplan mit allen Linien und Gates

Linie	G0 **Entscheidung**	G1 **Projektauftrag**	G2 **Anforderungsbasis**	G3 **Pflichtenheft**	G4 **Abnahme und Go-Live**	G5 **Check-in**	G6 **Stage Gate**
A Artefakte klassisch	Business Case nach Five Case Model mit Optionen A, B, C und Nichtstun F	Projektauftrag mit Zielen, Umfang, Meilensteinen, Budget und Risiken R	Lastenheft als Anforderungsbasis: FR, BR, NFR und Rückverfolgungsmatrix F	Pflichtenheft mit Realisierungsvorgaben, Parametern und Abnahmekriterien R	Testprotokoll und Abnahmeprotokoll R	Statusbericht mit den Zwischenwerten der Ziele A	Entscheidungsvorlage zum Stage Gate mit gemessenen Werten R
A Artefakte agil	Produktvision und erste Idee eines Product Goal A	Product Goal und Story Map als Umriss des Product Backlog R	Product Backlog mit Epics und Stories, Akzeptanzkriterien nach INVEST F	Backlog mit Definition of Done, Architekturentscheidungen und Schnittstellen R	Increment, das die Definition of Done erfüllt A	Backlog neu geordnet nach Hebel auf die Key Results F	Product Backlog für Release 2, geordnet nach dem Ergebnis des Gates A
K Kommunikation klassisch	Entscheidungsvorlage an den Lenkungskreis F	Kick-off und Meilensteinplan M0 bis M6 R	Review der Anforderungsbasis mit Test, Datenschutz und Fachseite R	Freigabe-Review des Pflichtenhefts und Statusbericht an die Sponsorin A	Abnahmetermin und Abstimmung mit dem Betriebsrat vor Go-Live R	Statusbericht und Abgleich mit dem Meilensteinplan A	Stage-Gate-Sitzung, die Sponsorin entscheidet R
K Kommunikation agil	Interviews und Workshops mit Stakeholdern (Interviewfragen, Story Map) F	Refinement beginnt: Epics werden in Stories zerlegt A	Refinement-Sitzungen: Stories mit Akzeptanzkriterien und Definition of Ready F	Sprint Planning: Sprint-Ziel aus dem geordneten Backlog A	Daily Scrum, Sprint Review mit Gästen und Sprint Retrospective A	Sprint Review zeigt die Wirkung; OKR-Check-in mit dem Team F	Review mit der Sponsorin; Product Goal für Release 2 neu bewertet A
B Blickwinkel BA	Welches Ziel stützt das, und was kostet Nichtstun? F	Stützt jede Funktion im Umfang ein Ziel, und was ist ausgeschlossen? R	Sind Anforderungen eindeutig, prüfbar und bis zum Ziel rückverfolgbar? F	Hat jede Anforderung eine Realisierungsvorgabe und einen Prüfweg? R	Erfüllt das Ergebnis den Bedarf, und welche Lücke bleibt (etwa FR-14)? F	Welche Wirkung zeigen die Key Results, und was erklärt Abweichungen? F	Stimmt der gemessene Nutzen mit dem Business Case überein? F
B Blickwinkel PM	Was kostet es (380.000 EUR plus 60.000 EUR Betrieb pro Jahr), und welches Risiko gibt es? F	Wer leitet das Projekt, und welche Budgets und Termine gelten? A	Ist der Termin M1 realistisch, und wer schätzt? A	Passt der Plan zum Budget, und wer trägt die offenen Risiken? R	Sind Termin, Budget, Abnahme und Betriebsvereinbarung erreicht? R	Wo steht der Plan, und welche Risiken sind neu? A	Wie lautet die Entscheidungsvorlage, und wer entscheidet bis wann? R
L Leitplanken	Leitplanken früh erkennen: Datenschutz, Mitbestimmung, Lebensmittelrecht, Zahlung F	Betriebsrat und Datenschutz als Stakeholder im Auftrag; Leitplanke L-3 verankert R	DSGVO, § 87 BetrVG, LMIV und PCI DSS in den Anforderungen (FR-13, FR-16, NFR-03, NFR-04) F	Rechtsgrundlagen als offene Punkte; NFR nach ISO/IEC 25010:2023 R	Betriebsvereinbarung und Datenschutz-Dokumentation vor Go-Live F	Pulsbefragung zum Vertrauen in die App (KR3.1); Klärungsdauer von Beschwerden (KR3.2) F	KR3.2 ist verpflichtend: über 5 Tage Klärungsdauer heißt Freigabe nur mit Auflage F
Ä Änderung	Annahmen offen als Annahmen führen; GZ-2 als Hypothese R	Änderungen nur per Änderungsantrag; die Sponsorin entscheidet R	Basislinie v1.0 der Anforderungen mit Rückverfolgungsmatrix F	Regeln als Parameter (NFR-10) halten Änderungen klein R	CR-01: Vorlauf von 60 auf 90 Minuten, danach Basislinie v1.1 F	Nach dem Check-in ist ein zweiter Änderungsantrag möglich (KR1.3, BR-3) F	Umfangsänderungen nur mit Entscheidung am Gate R
N Nutzen	Harter und weicher Nutzen getrennt; Break-even bei 0,3 % Zeitverwertung (bei 900 Gästen, GZ-4; bei 640: 3,3 %) F	GZ-1 bis GZ-4 mit Ausgangswert, Zielwert und Frist F	Jede Anforderung führt über Epic und Story zu einem Ziel F	Messweg für EM-1 und GZ in den Abnahmekriterien vorbereitet A	Ausgangswerte vor Go-Live festhalten: 33 % Abfall, 65 Minuten R	Zwischenwerte der Key Results KR1.1 bis KR3.2 F	Ampel-Vorschlag: KR1.2 mindestens 0,70 (35 % Nutzung) und KR2.1 mindestens 0,50 (höchstens 26,5 % Abfall) F
